

景德镇诚隆通贸易有限公司
昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目

安全验收评价报告
(终稿)

法定代表人：马 浩

技术负责人：侯 英

评价项目负责人：李金星

二〇二四年五月六日

评价人员

	姓名	专业能力	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	李金星	爆炸技术	S011032000110202 000779	040588	
项目组成员	邹文斌	安全	S011032000110192 001449	024656	
	张 伟	电气	1700000000301547	031413	
	喻荷兰	火炸药	1800000000201251	034105	
	董 光	机械	1800000000301254	032850	
报告编制人	李金星	爆炸技术	S011032000110202 000779	040588	
	张 伟	电气	1700000000301547	031413	
报告审核人	王 干	爆炸技术	S011032000110192 001419	035905	
过程控制负责人	朱细平	化工工艺	S011035000110202 001361	027047	
技术负责人	侯 英	爆炸技术	0800000000103231	003965	

景德镇诚隆通贸易有限公司
昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全验收评价
技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

2024年05月06日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字[2017]178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

**景德镇诚隆通贸易有限公司
昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目
安全设施竣工验收评审意见**

根据国家安全生产相关法律法规，景德镇诚隆通贸易有限公司于2024年04月28日组织有关专家对该公司烟爆存储建设项目安全设施进行验收，对南昌安达安全技术咨询有限公司编制的《景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全验收评价报告》（简称《报告》）进行评审，对项目安全设施进行了现场验收。景德镇市应急管理局、昌江区应急管理局派员参加。专家组听取建设单位对建设项目情况的汇报，评价机构对《报告》的编制情况作出了说明，查阅了有关图纸资料并进行现场检查后，形成如下意见：

一、景德镇诚隆通贸易有限公司位于江西省于江西省景德镇市昌江区荷塘乡政府院内，烟爆存储建设项目位于江西省景德镇市昌江区荷塘乡仓下村六斗坞山场，库区占地面积约19.5亩，建成2号爆竹成品库（1.3级、面积为495 m²、核定药量：10000kg），3号烟花成品库（1.3级、面积为495 m²、核定药量：10000kg），4号收缴/回收仓库（1.1⁻²级、面积为75 m²、核定药量：500kg），1号办公室（含门卫值班室和监控室）（62.5m²）、5号消防泵房（14m²）、6号消防蓄水池。

该项目经营储存C、D级烟花类（不含摩擦药产品）和C级爆竹类成品。

二、该项目现场需完善以下内容：

1. 完善库区平面图、风险管控图和风险管控责任清单。
2. 库区出入口增设隔离栏杆，配置机动车防火罩。
3. 2号爆竹成品库和3号烟花成品库要素牌中建筑面积，4号收缴/回收仓库要素牌中建筑面积与设计图纸不符；要素牌中未标明责任人。

4. 视频监控系统未配置 UPS 电源。

5. 完善库区围墙（围栏）。按设计要求完善 4 号收缴/回收仓库防护屏障。4 号收缴/回收仓库通风窗应设防护网。库区废弃建筑物应拆除。

6. 根据施工图纸，完善烟花成品库和爆竹成品库生活水池。

7. 烟花成品库和爆竹成品库东北面陡坎现场施工与设计图纸不符。

三、《报告》还应按以下意见修改完善：

1. 完善评价依据：增加《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《烟花爆竹 组合烟花》（GB19593-2015）。

2. 《表 2.7-1 项目仓库内部距离情况一览表》中应删除 2 号、3 号仓库到 1 号办公室距离信息，在《表 2.7-2 成品库外部距离情况一览表》中应补充 2 号、3 号仓库到 1 号办公室距离信息。

3. 报告中应补充《景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全设施设计》中安全措施落实情况。

综上所述，专家组认为：景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目的安全设施按专家组意见整改完善；《景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全验收评价报告》按专家组意见修改完善后通过评审。

专家组：



任之燕



2024 年 04 月 28 日







关于景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全设施竣工验收评审意见的修改情况


根据国家安全生产相关法律法规，2024年04月28日，景德镇诚隆通贸易有限公司组织有关专家对该公司烟爆存储建设项目安全设施进行验收，并对我公司2024年04月19日出具的《景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全验收评价报告》提出了核查意见。收到评审意见后，我公司立即召集项目评价组对专家组提出的意见进行学习，并会同景德镇诚隆通贸易有限公司交换意见、研究可采取的落实方案，对本项目的安全验收评价报告进行了修改和完善。现将对专家组提出的意见落实情况汇总如下：

安全验收评价报告存在问题


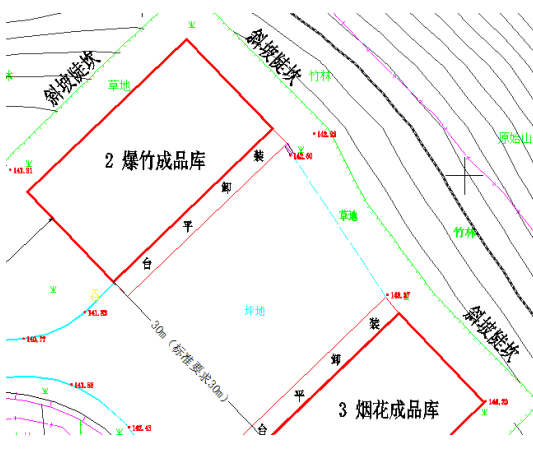
序号	专家组意见	本项目《安全现状评价报告》相关评价的修改或落实情况
1	完善评价依据：增加《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《烟花爆竹 组合烟花》（GB19593-2015）；	第“1.3.2”章节已增加《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《烟花爆竹 组合烟花》（GB19593-2015）；
2	《表 2.7-1 项目仓库内部距离情况一览表》中应删除2号、3号仓库到1号办公室距离信息，在《表 2.7-2 成品库外部距离情况一览表》中应补充2号、3号仓库到1号办公室距离信息；	《表 2.7-1 项目仓库内部距离情况一览表》中已删除2号、3号仓库到1号办公室距离信息，并在《表 2.7-2 成品库外部距离情况一览表》中应补充2号、3号仓库到1号办公室距离信息；
3	报告中应补充《景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全设施设计》中安全措施落实情况。	报告中第“5.9.2”章节已补充《景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全设施设计》中安全措施的落实情况。

企业现场问题整改情况认定表

序号	现场问题	整改情况	整改后照片	结论														
1	完善库区平面图、风险管控图和风险管控责任清单；	已完善库区平面图、风险管控图和风险管控责任清单；	 <p>景德镇诚隆通贸易有限公司 烟花爆竹经营仓库</p> <p>总平面布置图</p> <p>安全疏散路线</p> <p>风险辨识分级管控牌</p> <p>工房编号：04 工房名称：成品库 风险等级：3级</p> <p>安全第一 预防为主 综合治理</p> <table border="1"> <tr> <td>危险因素</td> <td>明火、静电、高混、撞击、摩擦、雷击、超员、超量</td> </tr> <tr> <td>事故类型</td> <td>火灾、爆炸</td> </tr> <tr> <td>引发原因</td> <td>1. 操作失误、火源、 2. 静电火花、 3. 违章作业、 4. 爆炸物在过程中因静电、摩擦、摩擦碰撞、 5. 雷击天气造成雷击、 6. 雷电、静电、</td> </tr> <tr> <td>管控措施</td> <td>1. 严禁烟火、火源、 2. 员工穿防静电鞋、在工房门口设置静电消除装置、设置防静电地板、 3. 防静电、接地、 4. 操作雷击(防静电)手闸、防静电、防静电鞋、 5. 严禁存放雷击、 6. 不超员、不超量储存、</td> </tr> <tr> <td>应急措施</td> <td>1. 一旦发生火灾事故立即报警、组织灭火、 2. 一旦发生爆炸事故立即疏散工房人员、疏散作业人员、疏散作业人员、疏散作业人员</td> </tr> <tr> <td>安全警示标志</td> <td></td> </tr> <tr> <td>应急救援电话</td> <td>火警电话：119 急救电话：120 应急救援电话：13707983744 责任人：景春江</td> </tr> </table>	危险因素	明火、静电、高混、撞击、摩擦、雷击、超员、超量	事故类型	火灾、爆炸	引发原因	1. 操作失误、火源、 2. 静电火花、 3. 违章作业、 4. 爆炸物在过程中因静电、摩擦、摩擦碰撞、 5. 雷击天气造成雷击、 6. 雷电、静电、	管控措施	1. 严禁烟火、火源、 2. 员工穿防静电鞋、在工房门口设置静电消除装置、设置防静电地板、 3. 防静电、接地、 4. 操作雷击(防静电)手闸、防静电、防静电鞋、 5. 严禁存放雷击、 6. 不超员、不超量储存、	应急措施	1. 一旦发生火灾事故立即报警、组织灭火、 2. 一旦发生爆炸事故立即疏散工房人员、疏散作业人员、疏散作业人员、疏散作业人员	安全警示标志		应急救援电话	火警电话：119 急救电话：120 应急救援电话：13707983744 责任人：景春江	符合要求
危险因素	明火、静电、高混、撞击、摩擦、雷击、超员、超量																	
事故类型	火灾、爆炸																	
引发原因	1. 操作失误、火源、 2. 静电火花、 3. 违章作业、 4. 爆炸物在过程中因静电、摩擦、摩擦碰撞、 5. 雷击天气造成雷击、 6. 雷电、静电、																	
管控措施	1. 严禁烟火、火源、 2. 员工穿防静电鞋、在工房门口设置静电消除装置、设置防静电地板、 3. 防静电、接地、 4. 操作雷击(防静电)手闸、防静电、防静电鞋、 5. 严禁存放雷击、 6. 不超员、不超量储存、																	
应急措施	1. 一旦发生火灾事故立即报警、组织灭火、 2. 一旦发生爆炸事故立即疏散工房人员、疏散作业人员、疏散作业人员、疏散作业人员																	
安全警示标志																		
应急救援电话	火警电话：119 急救电话：120 应急救援电话：13707983744 责任人：景春江																	
2	库区出入口增设隔离栏杆，配置机动车防火罩；	库区出入口已增设隔离栏杆，机动车防火罩已购买；	 <p>汽车之家 商家已发货</p> <p>汽车之家 商家已发货</p> <p>汽车之家 商家已发货</p> <p>汽车之家 商家已发货</p>  <p>库区出入口已增设隔离栏杆，机动车防火罩已购买；</p>	符合要求														

序号	现场问题	整改情况	整改后照片	结论								
3	2号爆竹成品库和3号烟花成品库要素牌中建筑面积,4号收缴/回收仓库要素牌中建筑面积与设计图纸不符;要素牌中未标明责任人;	2号爆竹成品库和3号烟花成品库要素牌中建筑面积已修改,4号收缴/回收仓库要素牌中建筑面积已修改;要素牌中已标明责任人;	安全要素标识牌	符合要求								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">工房编号: 02</td> <td style="width: 50%;">工房用途: 爆竹成品库</td> </tr> <tr> <td>危险等级: 1.3</td> <td>间数: 1间</td> </tr> <tr> <td>面积: 495m²</td> <td>操作定员: 2人/栋 /装卸时8人</td> </tr> <tr> <td>药物限量: 10000 kg/栋</td> <td>责任人: 吴春江</td> </tr> </table>		工房编号: 02	工房用途: 爆竹成品库	危险等级: 1.3	间数: 1间	面积: 495m ²	操作定员: 2人/栋 /装卸时8人	药物限量: 10000 kg/栋	责任人: 吴春江
			工房编号: 02		工房用途: 爆竹成品库							
危险等级: 1.3	间数: 1间											
面积: 495m ²	操作定员: 2人/栋 /装卸时8人											
药物限量: 10000 kg/栋	责任人: 吴春江											
安全要素标识牌	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">工房编号: 03</td> <td style="width: 50%;">工房用途: 爆竹成品库</td> </tr> <tr> <td>危险等级: 1.3</td> <td>间数: 1间</td> </tr> <tr> <td>面积: 495m²</td> <td>操作定员: 2人/栋 /装卸时8人</td> </tr> <tr> <td>药物限量: 10000 kg/栋</td> <td>责任人: 吴春江</td> </tr> </table>	工房编号: 03	工房用途: 爆竹成品库	危险等级: 1.3	间数: 1间	面积: 495m ²	操作定员: 2人/栋 /装卸时8人	药物限量: 10000 kg/栋	责任人: 吴春江			
工房编号: 03	工房用途: 爆竹成品库											
危险等级: 1.3	间数: 1间											
面积: 495m ²	操作定员: 2人/栋 /装卸时8人											
药物限量: 10000 kg/栋	责任人: 吴春江											
安全要素标识牌	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">工房编号: 04</td> <td style="width: 50%;">工房用途: 收缴/回收成品库</td> </tr> <tr> <td>危险等级: 1.1</td> <td>间数: 1间</td> </tr> <tr> <td>面积: 75m²</td> <td>操作定员: 2人</td> </tr> <tr> <td>药物限量: 500 kg/栋</td> <td>责任人: 吴春江</td> </tr> </table>	工房编号: 04	工房用途: 收缴/回收成品库	危险等级: 1.1	间数: 1间	面积: 75m ²	操作定员: 2人	药物限量: 500 kg/栋	责任人: 吴春江			
工房编号: 04	工房用途: 收缴/回收成品库											
危险等级: 1.1	间数: 1间											
面积: 75m ²	操作定员: 2人											
药物限量: 500 kg/栋	责任人: 吴春江											
4	视频监控系统未配置UPS电源;	视频监控系统已配置UPS电源;		符合要求								

序号	现场问题	整改情况	整改后照片	结论
5	完善库区围墙（围栏）。按设计要求完善 4 号收缴/回收仓库防护屏障。4 号收缴/回收仓库通风窗应设防护网。库区废弃建筑物应拆除；	已完善库区围墙（围栏）。4 号收缴/回收仓库防护屏障已完善。4 号收缴/回收仓库通风窗已设防护网。库区废弃建筑物已拆除；	   	符合要求

序号	现场问题	整改情况	整改后照片	结论
6	根据施工图纸，完善烟花成品库和爆竹成品库生活水池；	已烟花成品库和爆竹成品库生活水池；		符合要求
7	烟花成品库和爆竹成品库东北面陡坎现场施工与设计图纸不符。	烟花成品库和爆竹成品库东北面陡坎已与设计图纸一致。		符合要求

上所述，评价报告整体的修改情况达到了专家组提出的要求。同时，对于专家组以及各级领导给予的宝贵评审意见表示由衷的感谢！

南昌安达安全技术咨询有限公司

2024年05月06日

前 言

根据《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》（中华人民共和国国务院令[2006]第 455 号，2016 年 2 月 6 日国务院令第 666 号修改）第十七条和《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 65 号）第六条的规定：从事烟花爆竹批发的企业应依法进行安全评价。

景德镇诚隆通贸易有限公司（以下统称为“该公司”）成立于 2020 年 05 月 08 日，住所位于江西省景德镇市昌江区荷塘乡政府院内。该公司经济类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍佰万元，法人代表：吴春江。于 2024 年 04 月 29 日经景德镇市市场监督管理局变更登记核发《营业执照》，统一社会信用代码：91360202MA397NUR36。该公司经营范围：一般项目：建筑材料销售，日用百货销售，建筑工程机械与设备租赁，园林绿化工程施工，广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司于 2023 年 02 月 28 日向景德镇市应急管理局申请在荷塘乡仓下村六斗坞山场拟建一处烟花爆竹经营（批发）仓储点，以便更好的服务昌江区烟花爆竹经营市场。在企业递交《关于申请烟花爆竹批发经营许可的报告》后，景德镇市应急管理局于 2023 年 07 月 10 日下发了《市应急管理局关于昌江区设立烟花爆竹批发经营许可的函》，同意昌江区设立一家烟花爆竹批发点。此次拟申请从事烟花爆竹产品的批发、储存经营的许可，拟申请的许可范围：组合烟花类 (C、D) 级、玩具类(C、D) 级、吐珠类(C) 级、升空类(C) 级、旋转类(C、D) 级、喷花类(C、D) 级、爆竹类 (C) 级。

本项目是经企业申请，主管部门批复同意后进行建设。该项目库区共有 3 栋仓库（2 号爆竹成品库和 3 号烟花成品库的药物限量均为 10000kg，4 号收缴/回收库 500kg），地址位于江西省景德镇市昌江区荷塘乡仓下村六斗坞山场，安全管理责任由景德镇诚隆通贸易有限公司负责。成品库区与其生活区分开设置，为独立成品库区，景德镇诚隆通贸易有限公司的办公室设置在库区南侧。

在黑龙江龙维化学工程设计有限公司完成初步设计方案后，由景德镇市

应急管理局组织烟花爆竹行业相关专家对该公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目进行了安全设施设计审查，景德镇市应急管理局于 2024 年 02 月 05 日下发了《烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书》，审查意见书编号：景烟花爆竹项目安设审字〔2024〕1 号。

景德镇诚隆通贸易有限公司已完成了项目主体建筑及配套安全设施的建设，受其委托，我公司成立了该项目评价组，对该项目烟花爆竹储存仓库设施、经营安全条件及安全管理进行验收评价。评价过程中，安全评价项目组对景德镇诚隆通贸易有限公司烟花爆竹储存仓库区进行了现场勘查，查阅并收集了相关的安全技术文件，通过对该项目安全设施、仓储系统和安全管理状况等进行的全面了解、检查和分析，提出了针对性的安全技术对策措施和管理建议，并就相关问题与景德镇诚隆通贸易有限公司达成共识。按照《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的要求编制了本报告。

在评价过程中，评价组得到了应急管理局和安全生产专家的热情指导，景德镇诚隆通贸易有限公司对评价工作给予了积极的配合和协助，我公司在此一并表示诚挚的感谢！

关键词：烟爆存储建设、安全验收评价

目 录

1 概 述	1
1.1 评价目的	1
1.2 评价原则	1
1.3 评价依据	1
1.4 评价范围	4
1.5 安全评价的工作程序	4
2 企业的基本情况	6
2.1 企业概况	6
2.2 项目概况	6
2.3 地质气象情况	8
2.4 企业经营流程	9
2.5 主要经营设施设备	9
2.6 安全、消防设施	9
2.7 库区内外部安全距离表	11
2.8 企业安全管理情况	13
2.9 公用工程和辅助设施	14
3 主要危险因素辨识与分析	15
3.1 危险因素分析方法	15
3.2 成品的危险因素分析	16
3.3 重大危险源辨识	16
3.4 固有危险因素分析	19
3.5 主要设备危险因素分析	21
3.6 储运过程危险因素分析	21
3.7 环境危险因素分析	23
3.8 燃放试验和废弃物销毁危险因素分析	24
3.9 人员因素危险性分析	24
3.10 物的不安全状态危险因素分析	24

3.11 安全管理不足危险因素分析	25
3.12 装卸过程的危险因素辨识	25
4 评价单元的划分及评价方法的选择	26
4.1 评价单元的划分	26
4.2 评价方法的选择	26
4.3 评价单元划分的原则和方法	26
4.4 评价方法简介	27
5 定性、定量评价	29
5.1 资料审核评价	29
5.2 总体布局、条件和设施评价	29
5.3 安全防护设施、措施评价	29
5.4 电器、机械和工具安全性评价	30
5.5 重大危险源评价	30
5.6 评价单元/库房现场检查情况	30
5.7 重大事故隐患判定	30
5.8 安全生产条件符合性评价结果	32
5.9 建设项目安全“三同时”检查单元评价	34
5.10 综合验收评价结果	36
6 安全对策措施及整改	37
6.1 安全对策措施	37
6.2 安全对策措施整改复查	37
6.3 建议性安全对策措施	37
7 安全验收评价结论	41
7.1 安全设施整改项目安全设施“三同时”落实情况	41
7.2 安全设施整改项目安全验收评价结论	41
附录（评价报告的附录）	42
附件：景德镇诚隆通贸易有限公司提供的资料清单	53

1 概述

1.1 评价目的

通过对景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全设施的实际情况与国家有关法律、法规进行对照检查，分析查找可能存在的危险、有害因素，提出合理可行的安全技术措施和管理对策，提高企业安全管理和安全保障水平，为企业和有关部门管理提供依据；为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件；提出消除事故隐患的最佳技术方案。

1.2 评价原则

以景德镇诚隆通贸易有限公司的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务，自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则。

1.3 评价依据

1.3.1 国家有关法律、法规、标准和规范文件

表 1.3-1 法律、法规、标准和规范文件一览表

法律法规文件		
序号	名称	文号
1	《中华人民共和国安全生产法》	国家主席令第 70 号，2002 年 6 月 29 日；主席令第 88 号修正，2021 年 6 月 10 日
2	《中华人民共和国消防法》	国家主席令[2021]第 81 号
3	《中华人民共和国职业病防治法》（2018 年修正）	国家主席令[2011]第 52 号
4	《中华人民共和国气象法》（2016 年修正）	国家主席令[2016]第 57 号
5	《安全生产许可证条例》	国务院令第 397 号，2004 年 1 月 13 日；第 653 号修正，2014 年 7 月 29 日。
6	《烟花爆竹安全管理条例》（2016 年修正）	国务院令第 455 号，2006 年 1 月 21 日；第 666 号修正，2016 年 2 月 6 日。
7	《工伤保险条例》	国务院令第 375 号，2003 年 4 月 27 日，第 586 号修正，2010 年 12 月 20 日。
8	《烟花爆竹经营许可实施办法》	原安监总局第 65 号令，于 2013 年 10 月 16 日公布，自 2013 年 12 月 1 日起施行
9	《危险化学品目录（2015 版）》（2022 调整版）	应急管理部等十部门 2022 年第 8 号公告
10	关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知	财资[2022]136 号，2022 年 11 月 21 日。

11	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》	国家安监总局第 36 号令 2010 年 12 月 14 日，总局令第 77 号修正，2015 年 4 月 2 日。
12	《烟花爆竹生产经营安全规定》	原国家安全监管总局令第 93 号，2018 年 1 月 15 日。
13	《生产经营单位安全培训规定》	国家安监总局第 63 号令 2013 年 8 月 29 日；第 80 号令修正，2015 年 5 月 29 日）
14	《生产安全事故应急预案管理办法》	应急管理部 2019 年令第 2 号
15	《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》	中华人民共和国应急管理部令第 2 号
16	《江西省安全生产条例》	2007 年 3 月 29 日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017 年 7 月 26 日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2019 年 9 月 28 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023 年 7 月 26 日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订。
17	《江西省消防条例》	1995 年 12 月 20 日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2020 年 11 月 25 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正
18	《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》	2018 年 10 月 10 日江西省人民政府令第 238 号发布，2021 年 6 月 9 日江西省人民政府令第 250 号第一次修正
19	《江西省烟花爆竹安全管理办法》	2019 年 9 月 29 日江西省政府令第 241 号修改
国家标准、规范		
序号	名称	标准号
1	《烟花爆竹工程设计安全标准》	GB50161-2022
2	《烟花爆竹作业安全技术规程》	GB11652-2012
3	《烟花爆竹 安全与质量》	GB10631-2013
4	《烟花爆竹 组合烟花》	GB19593-2015
5	《烟花爆竹 抽样检查规则》	GB/T10632-2014
6	《建筑设计防火规范》（2018 版）	GB50016-2014
7	《消防设施通用规范》	GB 55036-2022
8	《建筑防火通用规范》	GB 55037-2022
9	《消防给水及消火栓系统技术规范》	GB50974-2014
10	《危险化学品仓库储存通则》	GB15603-2022
11	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》	GB17914-2013

12	《毒害性商品储存养护技术条件》	GB17916-2013
13	《生产过程危险和有害因素分类与代码》	GB/T13861-2022
14	《危险货物品名表》	GB12268-2012
15	《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140-2005
16	《粉尘防爆安全规程》	GB15577-2018
17	《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》	GB/T3836.1-2021
18	《安全标志及其使用导则》	GB2894-2008
19	《图形符号 安全色和安全标志》 第5部分：安全标志使用原则与要求	GB/T2893.5-2020
20	《爆炸危险环境电力装置设计规范》	GB50058-2014
21	《供配电系统设计规范》	GB50052-2009
22	《20kV 及以下变电所设计规范》	GB50053-2013
23	《低压配电设计规范》	GB50054-2011
24	《通用用电设备配电设计规范》	GB50055-2011
25	《系统接地的型式及安全技术要求》	GB14050-2008
26	《防止静电事故通用导则》	GB12158-2006
27	《安全验收评价导则》	AQ8003-2007
28	《烟花爆竹安全生产标志》	AQ4114-2011
29	《烟花爆竹防止静电通用导则》	AQ4115-2011
30	《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010
31	《企业职工伤亡事故分类》	GB6441-1986
32	《安全评价通则》	AQ8001-2007
33	《烟花爆竹企业安全评价规范》	AQ4113-2008
34	《烟花爆竹流向登记通用规范》	AQ4102-2008
35	《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》	AQ4111-2008
36	《烟花爆竹出厂包装检验规程》	AQ4112-2008
37	《烟花爆竹重大危险源辨识》	AQ4131-2023
38	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》	GB/T29639-2020

39	《中国地震动参数区划图》	GB18306-2015
40	《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》	AQ4101-2008
41	《烟花爆竹 化工原材料使用安全规范》	AQ4129-2019

1.3.2 企业提供的有关技术文件

企业提供的资料清单见附件

1.4 评价范围

本次安全验收评价范围为景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目的安全条件、安全管理，重点是对系统运行中的危险、危害因素进行分析与评价，针对系统中存在的主要安全缺陷和事故隐患，向企业管理者提出整改要求，提出进一步提高的安全对策措施与建议，本次验收评价不包括环境状况和职业卫生评价、厂外运输评价和外出燃放。有关消防、防雷、防静电、电气检测检验、原材料和产品的质量性能检测检验等符合性判定，以相关职能部门的检测报告或书面意见为准。

1.5 安全评价的工作程序

1.5.1 准备阶段

主要收集有关资料，现场考察，进行初步分析及危险、有害因素识别，选择评价方法。

1.5.2 实施评价阶段

运用合适的评价方法，针对现状分析的情况进行评价，提出合理可行的安全技术措施和安全管理对策。

1.5.3 报告编制阶段

主要将前两个阶段所得到的各种资料、数据进行综合分析，提出评价结论和建议，完成安全验收评价报告的编制。

安全评价程序见图下图所示。

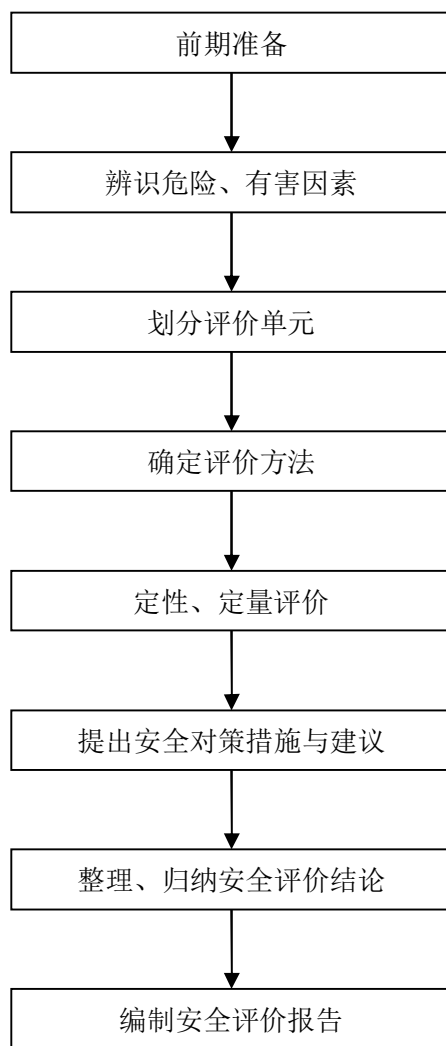


图 1.5-1 安全评价程序方框图

2 企业的基本情况

2.1 企业概况

表 2.1-1 企业基本情况表

企业名称	景德镇诚隆通贸易有限公司		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
住所	江西省景德镇市昌江区荷塘乡政府院内		
仓储设施地址	江西省景德镇市昌江区荷塘乡仓下村六斗坞山场		
原法定代表人	吴春江	联系电话	18179852234
统一社会信用代码	91360202MA397NUR36	登记机关	景德镇市市场监督管理局
注册资本（万元）	伍佰	库区面积（m ² ）	13000
主要负责人	吴春江	工作电话	18179852234
现有职工人数	5 人	专职安全员人数	1 人

2.2 项目概况

2.2.1 项目实施情况

景德镇诚隆通贸易有限公司成立于 2020 年 05 月 08 日，住所位于江西省景德镇市昌江区荷塘乡政府院内。该公司于 2024 年 4 月初完成仓储建设，此次新建有 1 栋 1.3 级爆竹成品库，2 号爆竹成品库面积为 495 m²，核定药量：10000kg；新建有 1 栋 1.3 级烟花成品库，3 号烟花成品库面积为 495 m²，核定药量：10000kg；新建 1 栋 1.1⁻²级收缴/回收仓库，4 号收缴/回收仓库面积为 75m²，核定药量：500kg；其他新建建筑物：1 号办公室（含门卫值班室和监控室）、5 号消防泵房（14m²）、6 号消防蓄水池。项目总投资 520 万，安全投资 50 万元。

2.2.2 设计单位

景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全设施整改由黑龙江龙维化学工程设计有限公司进行设计（工程设计资质证书编号：A123009016）。

2.2.3 烟花爆竹储存仓库安全设施整改设计审查意见

该公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目于 2024 年 02 月 05 日通过了景德镇市应急管理局组织的烟花爆竹建设项目安全设施设计审查，审查意见书编号：景烟花爆竹项目安设审字〔2024〕1 号。同意按照《景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目》进行施工。

2.2.4 企业管理人员组成

表 2.2-1 管理人员一览表

序号	姓名	类型	备注
1	吴春江	主要负责人	已报名培训，暂未培训取证
2	张益	安全生产管理人员	已报名培训，暂未培训取证
3	胡国富	安全生产管理人员	已报名培训，暂未培训取证

2.2.8 特种作业人员组成

表 2.2-2 特种作业人员一览表

序号	姓名	类型	备注
1	童志勇	烟花爆竹储存作业	已报名培训，暂未培训取证
2	徐良雨	烟花爆竹储存作业	已报名培训，暂未培训取证

2.2.9 经营种类和品种、范围

表 2.2-3 经营种类、品种、范围一览表

申 请 经 营 范 围	爆竹类[√]	产品分级	C[√]
	喷花类[√]	产品分级	A[] B[] C[√] D[√]
	旋转类[√]	产品分级	A[] B[] C[√] D[√]
	升空类[√]	产品分级	A[] B[] C[√]
	吐珠类[√]	产品分级	A[] B[] C[√]
	玩具类[√]	产品分级	C[√] D[√]
	礼花类[√]	产品分级	A[] B[]
	架子烟花类[√]	产品分级	B[] C[]
	组合烟花[√]	产品分级	A[] B[] C[√] D[√]
	烟火药[] 黑火药[] 引火线[]		

2.2.10 办公场所

表 2.2-4 办公场所一览表

办公地址	库区出入口
办公面积	62.5 m ²
备注	办公场所为新建建筑物

2.2.11 库区建（构）筑物组成

表 2.2-5 建（构）筑物一览表

编号	工房名称	占地面积 (m ²)	间数	危险等级	药物限量 (kg)	每间定员 (人)	建筑结构及屋盖形式	耐火等级	备注
1	办公室	62.5	-	无药					新建
2	爆竹成品库	495	1	1.3	10000	8	实心墙体，钢筋混凝土框架结构，钢梁彩钢瓦屋盖	二级	新建
3	烟花成品库	495	1	1.3	10000	8	实心墙体，钢筋混凝土框架结构，钢梁彩钢瓦屋盖	二级	新建
4	收缴/回收仓库	75	1	1.1 ⁻²	500	2	实心墙体，钢筋混凝土框架结构，钢梁彩钢瓦屋盖	二级	新建
5	消防泵房	14	1	无药			砌体承重结构		新建
6	消防蓄水池								新建

2.2.12 库区周边情况

该项目库区建设地址选址于江西省景德镇市昌江区荷塘乡仓下村六斗坞山场，位于景德镇市昌江区荷塘乡中部，坐标经度：117.1513313055，坐标纬度：29.1627579859。项目选址符合城乡规划的要求，并避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。根据企业提供的地形图及本公司评价人员现场勘查，该项目中危险品库房安全距离范围内无民用建筑，库房均建于山坳内，有自然山体可作为天然屏障，同时山体汇水面积较小，山坳内原始地面无明显冲刷痕迹。

2.3 地质气象情况

景德镇诚隆通贸易有限公司烟花爆竹存储仓库区位于江西省景德镇市昌江区荷塘乡仓下村六斗坞山场。

1、景德镇概况

景德镇，属赣东北丘陵山区，境内多山，其中山地 69.55%，水面 4.75%，

森林覆盖率 45.56%。气候属亚热带季风性湿润气候，夏热冬冷，春秋温和。气候温暖，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长达 248 天。冬季多偏北风，春夏之交梅雨绵绵，夏秋之际晴热干燥。全年主导风向为东北风，日照率 45%，年平均气温 17℃左右。年降水量在 1500-1800 毫米之间，多集中在夏季。

景德镇属丘陵地带，坐落于黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带，是典型的江南红壤丘陵区。市区内平均海拔 32 米，地势由东北向西南倾斜，东北和西北部多山，最高峰位于与安徽休宁接壤的省界地带，海拔 1618 米。

2.4 企业经营范围

景德镇诚隆通贸易有限公司属于从事烟花爆竹经营（批发）的企业，本身不具备危险货物运输资质。

景德镇诚隆通贸易有限公司经营方式（烟花爆竹产品）：公司向已取得《烟花爆竹安全生产许可证》等相关证照的生产企业采购烟花爆竹成品，向已取得《烟花爆竹经营（零售）许可证》的零售经营者供应烟花爆竹。采购烟花爆竹，由供货厂家负责送货到仓库。景德镇诚隆通贸易有限公司委托上饶市广丰区祥顺危货运输有限公司代为运输。上饶市广丰区祥顺危货运输有限公司具备危险货物运输资质，《道路运输经营许可证》编号为赣交运管许可饶字 361100200001 号，有效期至 2027 年 10 月 23 日，经营范围：具备烟花爆竹（属于 1.4 项爆炸物）运输资质，押运员，驾驶员均取得了道路运输人员从业资格证，经营范围符合烟花爆竹产品运输要求。

2.5 主要经营设施设备

景德镇诚隆通贸易有限公司主要经营设施设备为运输车辆，运输车辆贴有安全警示标志，装有卫星定位装置。

2.6 安全、消防设施

2.6.1 消防设施

景德镇诚隆通贸易有限公司库区设立有消防器材房，配备了较齐全的消防设备设施，如消防水池、消防水带、消防水枪、灭火器等。

2.6.2 防雷、防静电设施

经现场勘查，库区 1.1 级属一类防雷建筑、1.3 级仓库属二类防雷建筑，库房主要防雷形式为接闪线与引下线，烟花爆竹仓库入口处设置消除人体静电装置。

库区新建储存仓库的防雷设施均经江西赣象防雷检测中心有限公司景德镇分公司检测合格，并出具了江西省雷电防护装置检测报告，2 号爆竹成品库和 3 号烟花成品库的报告编号为：1152017005 雷检字[2024]60000003，有效期至 2024 年 07 月 17 日；4 号收缴/回收库的报告编号为：1152017005 雷检字[2024]60000026，有效期至 2024 年 10 月 12 日；检测结论均为：合格。详情见报告附件。

库区新建储存仓库的防静电装置经吉林华云气象科技有限公司检测合格，并出具了防静电检测报告，2 号爆竹成品库和 3 号烟花成品库的报告编号为：HY-JXJX-06-2024-0024，有效期至 2024 年 09 月 22 日；4 号收缴/回收库的报告编号为：HY-JXJX-06-2024-0046，有效期至 2024 年 10 月 17 日；检测结论均为：合格。详情见报告附件。

2.6.3 视频监控与通信

景德镇诚隆通贸易有限公司委托景德镇市潮迈信息技术有限公司在库区出入口、运输道路、仓库等安装了视频监控装置。并于 2024 年 04 月 10 日由安装单位出具了网络视频监控系统安装验收单。景德镇诚隆通贸易有限公司在库区出入口设有值班室，值班室配备电话，配备有固定值守人员，值守人员均配备有固定移动电话。

景德镇诚隆通贸易有限公司成立了应急救援小组，持有移动电话进行通信联络。

2.6.4 照明设施

经现场勘查，仓库内未设置照明灯具，值班室设置普通照明灯具，在值班室内配置防爆型移动应急照明设备。

2.6.5 电气设备的选型与安装

经现场勘查，该项目库房内外无照明灯具、控制开关、插座。

2.6.6 电气线路的选型与敷设

经现场勘查，该项目库房内外不涉及电气线路。

2.6.7 防护屏障

该项目 1.3 级建筑物未设立防护屏障，4 号 1.1⁻² 级收缴/回收仓库四面利用自然山体和防护土堤作为防护屏障。

2.6.8 围墙

景德镇诚隆通贸易有限公司在库区四周部分设置实体密砌围墙，其余部分利用高山及较陡处采用刺丝网作为防护措施。

2.6.9 安全标识

经现场勘查，库区出入库的围墙及门柱上均设有安全警示标志，内容全面。该库区的仓库张贴有工房标识牌、安全操作规程、安全警示标志等。另外，在该库区的运输道路路边悬挂有限速牌，限速 15km/h。

2.7 库区内外安全距离表

2.7.1 内部距离

根据企业提供由黑龙江龙维化学工程设计有限公司设计的《景德镇诚隆通贸易有限公司总平面布置图》及现场勘查相结合，该项目库区此次新建仓库相邻建筑物之间的内部距离情况如下表 2.7-1 所示。

表 2.7-1 项目仓库内部距离情况一览表

仓库名称	相邻建筑物情况	实际距离 (m)	标准要求距离 (m)
2 号爆竹成品仓库 (1.3 级、定量 10000kg)	3 号烟花成品仓库 1.3 级，定量 10000kg	30	30
	最近围墙	>5	5
3 号烟花成品仓库 (1.3 级、定量 10000kg)	2 号爆竹成品仓库 1.3 级，定量 10000kg	30	30
	4 号收缴/回收仓库 1.1 ⁻² 级、定量 500kg	34	30
	最近围墙	>5	5
4 号收缴/回收仓库 (1.1 ⁻² 级、定量 500kg)	3 号烟花成品仓库 1.3 级，定量 10000kg	34	30
	6 号消防蓄水池	62	50
	最近围墙	>5	5

2.7.2 外部距离

该项目库区建设地址选址于江西省景德镇市昌江区荷塘乡仓下村六斗坞山场，位于景德镇市昌江区荷塘乡中部，坐标经度：117.1513313055，坐标纬度：29.1627579859。项目选址符合城乡规划的要求，并避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。项目设有2栋1.3级成品库和1栋1.1⁻²级收缴/回收仓库，3栋危险性建筑物外部距离的设置均满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的外部最小允许距离要求，具体情况见下表。

库区外安全距离范围内无加油站以及其它易燃、易爆、有毒、有害等危险品生产储存设施，也没有学校、幼儿园、商业机关等人员密集场所。该项目危险性建筑物与周边毗邻建（构）筑物之间的外部距离情况如下表所示。

表 2.7-2 成品库外部距离情况一览表

工房编号	工房名称	危险等级	药量 (kg)	方位	外部毗邻建筑物情况	要求距离 (m)	实际距离 (m)
2	爆竹成品库	1.3	10000	东面	78米范围内为山地	/	/
				南面	1号办公室	78	78
				西面	78米范围内为山地	/	/
				北面	78米范围内为山地	/	/
3	烟花成品库	1.3	10000	东面	78米范围内为山地	/	/
				南面	1号办公室	78	82
				西面	78米范围内为山地	/	/
				北面	78米范围内为山地	/	/
4	收缴/回收仓库	1.1 ⁻²	500	东面	145米范围内为山地	/	/
				南面	145米范围内为山地	/	/
				西面	1号办公室	有山体相隔，可按标准要求115m的75%取值为86.25m	108
				北面	145米范围内为山地	/	/

2.8 企业安全管理情况

2.8.1 机构设置

景德镇诚隆通贸易有限公司具备企业法人条件，设置了安全生产领导小组，明确了吴春江为主要负责人，并配备有2名专职安全员，专职安全员数量符合法规要求。同时公司设立有质量检验检测小组、仓库保卫小组和应急救援领导小组。

2.8.2 人员配备和教育培训

景德镇诚隆通贸易有限公司配备的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员已报名参加培训，暂未培训取证。安全生产管理人员、特种作业人员为景德镇诚隆通贸易有限公司员工，并进行了上岗前安全教育培训。

2.8.3 安全管理制度

吴春江是公司的法定代表人/主要负责人，是企业安全第一责任人，公司实行经理负责制，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人，齐抓共管警钟长鸣抓安全。

景德镇诚隆通贸易有限公司为保证烟花爆竹的经营、储存过程中的安全作业，制定了下列安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程：

1、安全生产责任制

主要包括：经理（法人）安全职责、主管安全副经理安全职责、仓库主任安全职责、安全生产管理人员（安全员）安全职责、义务消防队员安全职责、驾驶员安全职责、押运员安全职责、仓库保管员安全职责、搬运员安全职责、值班人员安全职责，并签订烟花爆竹经营安全责任书。

2、安全生产管理制度

主要包括：烟花爆竹仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、烟花爆竹产品检验验收制度、安全检查和隐患排查治理制度、生产安全事故应急救援与演练制度、事故报告制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度等。

3、安全生产操作规程

包括：货物查验操作规程、拆箱安全操作规程、搬运安全操作规程、装卸安全操作规程、运输安全操作规程、库房管理岗位操作规程等。

2.8.4 事故应急救援预案

企业针对经营系统存在的危险、有害因素及危险、有害后果，危险源颁布、特点及救援资源等，采取相应安全措施，制定了生产安全事故应急预案、安全风险评估报告、应急资源调查报告等，于 2024 年 03 月 20 日在景德镇市应急保障中心进行了备案，备案编号 360200-2024-009。景德镇诚隆通贸易有限公司的生产安全事故应急预案具有一定的应急指导性，应定期进行演练。

2.8.5 工伤保险和安全生产责任险

景德镇诚隆通贸易有限公司按国家的有关规定定期为从业人员发放劳保用品，并购买了工伤保险及安全生产责任保险。

2.9 公用工程和辅助设施

2.9.1 供电

由昌江区当地供电所供电。

2.9.2 供水

消防用水及员工生活用水由自备水井补给。

3 主要危险因素辨识与分析

3.1 危险因素分析方法

危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。

危险、有害因素主要是客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所。各危险、有害因素尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成危害的后果，都可归结为存在能量、有害物质以及能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用。人的不安全行为和物的不安全状态是导致能量意外释放的直接原因。能量、危险有害物质失控主要体现在工艺失控、设备故障、人失误、管理缺陷、环境因素五个方面。因此，危险、有害因素的分析与辨识宜从系统中是否存在能量和有害物质以及如何控制这些能量和有害物质入手。

辨识烟花爆竹在储存经营过程中存在的危险、有害因素必须坚持科学性、系统性、全面性和预测性相结合的原则。通常采用以下两种辨识方法。

3.1.1 经验法

1、对照法：对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观对评价对象的危险、危害因素进行分析的方法；

2、类比法：利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、危害因素。

3.1.2 系统安全分析方法

应用某些系统安全工程评价方法进行危险、危害因素辨识。系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统。常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。

3.2 成品的危险因素分析

烟花爆竹是以烟火药、引火线以及纸品等辅助材料为原料制成的工艺美术品，通过着火源作用燃烧（爆炸）并伴有声、光、色、烟雾等效果的娱乐产品。

3.2.1 烟花爆竹成品的危害特性

1、烟花爆竹成品属于易燃易爆危险物品，其危害特性为：

1) 敏感易爆性。通常能引起爆炸品爆炸的起爆能越小，则敏感度越高，其危险性也就越大。如含有高氯酸盐的烟火药就比含硝酸盐的烟火药更危险。

2) 遇热危险性。烟火药遇热达到一定的温度即自行着火爆炸。一般爆炸品的起爆温度较低，如含氯酸钾的烟火药剂就低于 200°C。

3) 机械作用危险性。烟火药受到撞击、震动、摩擦等机械作用时就会爆炸着火。

4) 静电火花危险。烟火药是电的不良导体。在包装、运输过程中容易产生静电，一旦发生静电放电会引起爆炸。

5) 火灾危险。绝大多数爆炸都伴有燃烧。爆炸时可形成数千度的高温，会造成重大火灾。

6) 毒害性。烟火药爆炸时会产生 CO、CO₂、NO、NO₂、KCL、HCN、N₂ 等有害或窒息性气体，从而引起人体中毒、窒息。

2、烟花爆竹成品经过包装及装箱后，药物直接外界接触机会减少，相对半成品的危险性降低。但成品在以下条件下均有发生火灾、爆炸的危险：

1) 产品配方不合理，产品质量存在缺陷，容易引起意外伤害事故；

2) 有火源的情况下，可能引燃烟花爆竹而产生燃烧与爆炸；

3) 搬运、运输过程中，由于用力过猛、颠簸、互相之间的撞击与摩擦，可能引起燃烧与爆炸。

3.3 重大危险源辨识

3.3.1 重大危险源辨识

按照《安全生产法》的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬

运、使用或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的单元。

本项目以《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023 为依据，对景德镇诚隆通贸易有限公司烟花爆竹仓库进行烟花爆竹重大危险源辨识。

1、烟花爆竹重大危险源定义

烟花爆竹重大危险源是指长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指涉及危险物品生产、储存单元。对于危险物品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个单元，当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传输带、转动装置等相连接时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。对于危险物品仓库区，每个库区内所有的烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

2、临界量的确定依据

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，烟花爆竹成品临界量按下表 3.3-1 确定。

表 3.3-1 烟花爆竹成品临界量 单位：吨

种类	临界量
含雷弹的礼花弹成品及其半成品； 7号及以上礼花弹成品及其半成品； 白药开包药大于7g的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品	1
6号及以下礼花弹成品及其半成品； 除雷弹外的其他效果内筒； 白药开包药小于等于7g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品； 双响产品及其半成品	5
单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹及其半成品； 单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹及其半成品	10
个人燃放类组合烟花及其半成品； 单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹及其半成品	50

上表中未规定临界量的，A 级烟花爆竹成品的临界量为 1 吨，B 级烟花爆竹成品的临界量为 10 吨，C 级和 D 级烟花爆竹成品的临界量为 50 吨。

3、烟花爆竹重大危险源辨识方法

按照下式计算单元的重大危险源辨识指标

$$S = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1 \dots \dots (1)$$

式中：S --重大危险源辨识指标；

q_1, q_2, \dots, q_n --各种危险物品设计存放量，单位为吨（t）。

Q_1, Q_2, \dots, Q_n --与各种危险物品对应的临界量，单位为吨（t）。

当单元的 $S \geq 1$ 时，则该单元判定为烟花爆竹重大危险源。

3.3.2 危险物质临界量标准

景德镇诚隆通贸易有限公司在储存场所中涉及的烟花爆竹品种比较多，储存的品种结构随着产品的增减经常变化，但储存的烟花爆竹是 C 级、D 级烟花和 C 级爆竹。根据该储存仓库的储存情况，按照《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023 中 5.4 条规定，C、D 级烟花和 C 级爆竹的临界量均为 50 吨。对于 1.1⁻² 级收缴/回收仓库，储存的烟花爆竹产品为不符合零售店售卖的产品，可能涉及到 A 级产品，该库房的临界量取最严格的数值 1 吨。

3.3.3 重大危险源辨识结果

景德镇诚隆通贸易有限公司此次新建的烟花爆竹仓库，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。评价组将景德镇诚隆通贸易有限公司新建的 3 栋烟花爆竹储存仓库作为辨识单元进行烟花爆竹重大危险源辨识。与本项目有关的烟花爆竹的临界量列于表 3.3-2。

表 3.3-2 烟花爆竹名称及其临界量

序号	类别	烟花爆竹名称和说明	临界量（吨）
1	烟花	A 级烟花	1
2	烟花爆竹	C、D 级烟花和 C 级爆竹	50

本评价项目的主要烟花爆竹存放地点及最大存量列于表 3.3-3。

表 3.3-3 烟花爆竹存放地点及最大存量表

危险物质名称	存放地点	实际最大存药量（吨）
烟花爆竹	2号爆竹成品库	10
烟花爆竹	3号烟花成品库	10
烟花爆竹	4号收缴/回收仓库	0.5

根据表 3.3-2 和表 3.3-3 所列数据，代入上（1）式子计算得：

表 3.3-4 烟花爆竹重大危险源辨识结果表

辨识单元	最大计算药量 q(t)	标准规定临界量 Q(t)	q/Q	是否构成重大危险源
2号爆竹成品库	10	50	$10/50=0.2 < 1$	否
3号烟花成品库	10	50	$10/50=0.2 < 1$	否
4号收缴/回收仓库	0.5	1	$0.5/1=0.5 < 1$	否

根据上表计算的结果可知：景德镇诚隆通贸易有限公司成品库不构成烟花爆竹重大危险源。

但企业应当按照国家有关规定，定期对成品库的安全设施进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证成品库的安全设施有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录。

3.4 固有危险因素分析

参照《企业职工伤亡事故分类》（CB6441-1986）标准，景德镇诚隆通贸易有限公司库区烟花爆竹的固有危险因素有火灾爆炸、物体打击、高处坠落等，各项事故分析如下：

1、火灾、爆炸

1) 烟花爆竹库房中储存烟花爆竹产品，烟花爆竹遇火源（明火、静电火花、摩擦火花等）、外部冲击可能导致火灾、爆炸。

2) 烟花爆竹库房未安装防雷防静电装置或防雷防静电检测不符合，雷击可能导致烟花爆竹产品燃烧、爆炸。

3) 烟花爆竹库房内如果安装非防爆型电气设备，可能产生静电火花而使烟花爆竹产品燃烧、爆炸。

4) 烟花爆竹库房发生爆炸可能引起相邻建筑物燃烧事故。

5) 烟花爆竹产品中有自燃物质，如果堆放过密、不合理或通风不畅，新建仓库库内温度过高，可能导致烟花爆竹产品自燃而发生燃烧、爆炸。

6) 烟花爆竹产品中有遇湿易燃物质，如果新建仓库未采取防潮措施，新建仓库库内过度潮湿，可能引起烟花爆竹产品发生燃烧爆炸。

7) 烟花爆竹产品有混触危险性物质，如果仓库内地面不平整，无清除漏药、散药措施，混触危险性物质可能发生混触而产生燃烧、爆炸。

8) 库内开箱可能引起烟花爆竹产品发生燃烧爆炸。

2、触电

烟花爆竹库区内如有电气设备，电气设备出现裸露、断线、未接地或接地不良，可能导致人员触电。

3、中毒窒息

1) 烟花爆竹库房内如果通风不良、安全出口不合理，当烟花爆竹产品燃烧爆炸时会产生大量的有毒有害物质，可能导致人员中毒窒息。

2) 烟花产品中含有有毒有害物质，如果产品未包装严密，有散件或散落药物现象，人员接触摄入口中，可能导致人员中毒。

4、高处坠落

当人员检修库房在屋顶作业时，如果无防护，可能从屋顶高处坠落。

5、淹溺

消防水池无防护，可能导致人员掉入水池而造成淹溺。

6、物体打击

1) 仓库内货物堆垛过高，可能导致物品装卸操作时坠落打击人员造成伤害。

2) 仓库内运输通道不足，装卸操作不当，可能引发物体打击伤害。

7、车辆伤害

烟花爆竹仓储库区内如果车辆通行通道太窄、坡度过大、货场狭窄可能造成人员车辆伤害。

8、自然危害

本项目如果排洪设施堵塞，遇特大、暴雨可能发生库区淹水，山体滑坡，

泥石流等自然灾害，产品受潮，电器受潮，湿度加大，并进一步引发二次事故等危险。

雷电是大气云层中的电荷相互或对地放电形成的一种自然现象，具有很强的破坏力。雷电产生的危害事故主要有以下几个方面：

1) 直击雷放电、二次放电，雷电流的热量均可能引起火灾和爆炸。

2) 雷电的直接击中、金属导体的二次放电、跨步电压的作用会引起火灾爆炸的间接作用，均会造成人员的伤亡。

3) 强大的雷电流、高电压可导致电气设备击穿或烧毁。雷击可直接毁坏建筑物、电气设施。

9、其他

1、烟花爆竹产品由化学原料配比混合而成，其中含有硝酸钾、硝酸钡、硫磺等有毒物质，如果烟花爆竹产品包装不严，化学原料散落，从业人员接触或误食，则可能造成中毒。

2、烟花爆竹燃烧爆炸产物含一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等有毒有害气体，如果发生燃烧爆炸时，人员不能及时安全疏散，则可能造成中毒危害。

3.5 主要设备危险因素分析

表 3.5-1 主要设备危险因素分析表

序号	类别	危险因素	危险后果
1	车辆伤害	1、车辆故障； 2、操作失误； 3、超载、超速； 4、道路缺陷。	车辆损坏或人员伤亡

3.6 储运过程危险因素分析

3.6.1 储存过程危险有害因素辨识

成品仓库发生的危险首先是燃烧，燃烧一定时间后，产生高温，可能形成爆燃、爆炸。

成品仓储场所存药量较大，危险性较大，储存的物品都是已有氧化剂、

可燃物质等组成,对机械能、热能及其它能量引燃引爆值要求降低,遇火源、高温、摩擦、撞击、电火花等,即会发生燃烧甚至爆炸。储存过程危险有害因素分析如下:

1、库区的选址必须符合国家标准的相关规定,安全距离和安全间距必须符合《烟花爆竹工程设计安全标准》的要求,使人员和危险源保持隔离,达到降低危险性。

2、明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质,由于未经过安全知识培训,安全意识薄弱,极易产生违规操作,在仓库内违规抽烟、违规使用铁制等容易产生火花的器具、取暖等原因,易引发爆炸事故。

3、受太阳直射、局部热量聚集,当达到一定温度时,引起火药的自燃,产生明火导致爆炸事故。

4、产品质量不合格,使用了违禁原料,或产品过于敏感,在正常的储存条件下引发事故。

5、烟花爆竹库区相应较独立,要做好防雷电设计,并采取有效避雷措施,防止雷电造成的燃烧、爆炸事故的发生。

6、静电起火,烟花爆竹在作业过程中产生的静电积聚和人带有静电,无消除静电装置接地造成静电积聚放电,如穿硬底鞋、带钉鞋,操作时发生的撞击、挤压、摩擦、抛掷等。

7、潮气和雨水直接影响产品的质量,同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末,铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气,积热后自燃。若漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮,可产生分解爆炸。

8、储存药量超过定量指标,可能导致灾害扩大。

9、安全机构不健全,责任不落实,监督不到位,未及时发现安全隐患。

10、烟花、爆竹同存,容易由燃烧转为爆炸,使事故多发或扩大,因此建议烟花爆竹分库存放。

3.6.2 运输过程危险有害因素辨识

产品运输过程中可能因人为、车辆或环境因素的原因导致意外事故发生,

可能导致的意外事故：

1、若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

2、在运输时，因驾驶员和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

3、运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

4、产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

5、运输的线路未按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大。

6、因驾驶员忽视或违反交通法规、违章行车，安全意识不强、酒后开车、疲劳驾车，判断、操作错误，缺乏安全知识，心里素质较差、反应时间过长、身体缺陷；

7、因车辆安全装置失效（如制动器失效、方向失控、轮胎不合格、灯光不全等）。

8、因道路不平整，坡度大，转弯半径小，缺少交通标志、标线等安全设施，均可造成碰撞或翻车，产生静电或火花引起产品燃烧与爆炸。

9、运输车辆停靠时没有加强监管，引起事故的发生。

10、使用非专用车辆进行运输，造成事故的发生。

11、装卸工人违章作业，抛、摔、凿等行为导致产品爆炸。

12、运输的线路没有按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大。

3.7 环境危险因素分析

环境影响也是造成火灾爆炸的危险、有害因素，景德镇诚隆通贸易有限公司处于我国南方地域。环境对成品造成的主要危险、有害因素有：春季潮湿（多雨季节）气候、天气突然反常、刮大风、下暴雨时易使成品吸潮，发生化学反应，放出热量有引起燃烧爆炸危险；雷电易引燃引爆成品的危险；秋冬干燥季节山火；春节、祭祀期间周边扫墓；高温环境、潮湿环境，可能导致烟花爆竹的燃烧与爆炸。

3.8 燃放试验和废弃物销毁危险因素分析

表 3.8-1 燃放试验和废弃物销毁危险因素分析表

序号	类别	危险因素	危险后果
1	灼烫	处理报废烟花爆竹操作不当。	烫伤
2	火灾爆炸	有明火及处理报废烟花爆竹操作不当。	火灾爆炸

3.9 人员因素危险性分析

人存在的不安全行为主要有：

- 1、装卸作业中，多件搬运，碰撞、拖拉、抛掷、摩擦、翻滚和剧烈振动，使用铁撬等铁质工具；
- 2、运输中强行抢道；
- 3、有分散注意力的行为，必须使用个人防护用品用具的作业场所中，忽视其使用，不安全装束；
- 4、从业人员酒后上班；
- 5、人员在仓库区内使用明火；
- 6、操作错误、忽视安全、忽视警告；
- 7、造成安全装置失效；
- 8、违章指挥；
- 9、违章作业；
- 10、心理异常；
- 11、带病上岗。

以上这些不安全行为均有可能造成各种伤害危险或事故。

3.10 物的不安全状态危险因素分析

物的不安全状态主要有：

- 1、进入仓库区的机动车辆，未装防火花装置；
- 2、库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间未留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度少于 1.5m；
- 3、成品堆垛高度大于 1.5m，成箱成品堆垛高度大于 2.5m；

- 4、库房内木地板，垛架和木箱上使用的铁钉，钉头不低于木板外表面3mm以上，钉孔未用油灰填实；
- 5、无地板的仓库，地面未设置20cm高的垛架，未铺防潮材料；
- 6、木质包装在库房内进行拆箱、钉箱和其它可能引起爆炸的作业；
- 7、库房内未有测温、测湿计，未作好防潮、降温、通风处理；
- 8、消防设施、灭火器未定期检查、失效，火灾状态下违规使用水枪喷射堆垛。
- 9、防雷防静电设施未定期检测、失效。

以上这些不安全行为均有可能造成各种伤害危险或事故。

3.11 安全管理不足危险因素分析

安全管理不足的主要表现有：烟花爆竹储存、运输过程中存在缺陷、未能实现本质安全化设计；企业主要负责人和安全生产管理人员未参加安全生产监督管理部门组织的培训，未考核合格，未取得上岗资格证；企业对员工的安全教育和技术培训不足，未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识；劳动组织不合理；对现场作业缺乏指导、检查或指导错误；没有安全操作规程或不健全；仓库检维修作业（如仓库漏水、窗户打水可能导致烟花爆竹吸湿引起火灾爆炸事故）未执行动火审批制度；超高存放，箱体搬运不慎跌落砸伤人员；没有或不认真执行实施事故防范措施，对事故隐患整改不力以及其它安全管理缺陷等。以上这些安全管理缺陷有间接导致事故发生的可能性。

3.12 装卸过程的危险因素辨识

在烟花爆竹装卸过程中，因野蛮装卸或体力不济而造成烟花爆竹翻滚、拖拉、踩踏、坠落、撞击，有引燃引爆烟花爆竹的危险。

4 评价单元的划分及评价方法的选择

4.1 评价单元的划分

本项目根据景德镇诚隆通贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）的实际情况，将整个项目（系统）划分为资料审核、总体布局和条件设施、评价单元/库房现场检查情况三个评价单元。

4.2 评价方法的选择

本项目属安全验收评价，项目安全条件符合性评价，采用安全检查表法。

4.3 评价单元划分的原则和方法

划分单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特性与危险、有害因素类别、分布有机结合划分。还可按评价的需要将一个单元再划分为若干个子评价单元或更仔细的单元。

常用的评价单元划分方法：

以危险、危害因素类别为主划分

1、以工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对项目（系统）的影响等综合方面的危险、危害因素分析和评价，宜将整个项目（系统）作为一个单元。

2、将具有共性危险因素、危害因素的场所和装置划为一个单元。按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在因素不同）划分成子单元分别评价。

按装置和物质特征划分

1) 按装置工艺功能划分；

2) 按布置的相对独立性划分；

3) 按工艺条件划分；

4) 按贮存、处理危险物质的潜在化学性能，毒性和危险物质数量划分；

5) 按事故损失程度或危险性划分。

4.4 评价方法简介

安全评价方法的分类有多种，如按可能获得的安全评价的定性或定量结果，可分为定性安全评价、半定量安全评价和定量安全评价。

安全评价方法多，各种方法都各具有自身特点，并适于特定的场合，适用烟花爆竹安全评价的方法主要有：安全检查表法；爆炸伤害/破坏模型法；预先危险性分析；危险及可操作性研究；事故树分析；故障树分析；危险指数评价法；矩阵法；定量风险评价等方法。

4.4.1 安全检查表法

安全检查表法（Safety Check List，缩写 SCL）是系统安全工程中的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术，安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单位和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准内容的表格（清单）。

对系统进行评价、验收时，对照安全检查表逐项检查、赋分，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分，评级等内容和步骤。

安全检查表的优缺点

1、优点

1) 避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗留等弊端，可全面查出危险、危害因素（包括各类隐患）和工作漏项。

2) 应用编制的系统检查表并依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化。

3) 对不同的检查对象、检查项目有不同的检查表，应用范围广泛。

4) 安全检查表简明易懂，实用方便，易于掌握，能弥补有关人员知识，经验不足的缺陷。

5) 检查人员依据安全检查表进行检查，检查结果即检查人员履行职责

的凭证，能落实安全生产责任制。

2、缺点

针对不同的需要，须事先编制大量的检查表，工作量大且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影响。

5 定性、定量评价

5.1 资料审核评价

资料审核主要采用检查表法和现场检查法，内容包括《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008 规定的检查表所列项目，主要有企业组织机构、从业人员、规章制度和技术资料等。根据国家现行法律、行政法规和标准规范要求进行符合性评价，评价结果见附录 A1（评价报告的附录）：烟花爆竹企业安全评价资料审核表；审查和检查为不合格的，经采取措施整改后评价认定达到安全要求的项目见附录 B（评价报告的附录）：审查和检查为不合格，经采取措施整改后，评价认定达到安全要求项目汇总表。

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.2 总体布局、条件和设施评价

仓库总体布局、条件和设施单元，主要采用检查表法和现场检查法，内容包括《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008 规定的检查表所列项目，主要有总体布局、条件和设施等，并对项目选址、规划、分区进行适当追踪。根据国家现行法律、行政法规和标准规范要求进行符合性评价，评价结果见附录 A2（评价报告的附录）：烟花爆竹企业安全评价总体布局、条件和设施现场检查表；审查和检查为不合格的，经采取措施整改后评价认定达到安全要求的项目见附录 B（评价报告的附录）：审查和检查为不合格，经采取措施整改后，评价认定达到安全要求项目汇总表。

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.3 安全防护设施、措施评价

库区安全防护设施和措施主要有：定级、定量和定员、危险性建筑物建筑结构和与其他建筑物的内部距离、防雷设施、消防设施、运输道路、安全标志标语等，符合相关标准要求。其安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.4 电器、机械和工具安全性评价

库区主要电器是值班室照明电器，采用日光灯照明，符合相关标准要求。运输车辆采用轻型厢式货车，取得道路危险货物运输资质，符合相关标准要求。

5.5 重大危险源评价

景德镇诚隆通贸易有限公司属于从事烟花爆竹经营（批发）的公司，依据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，景德镇诚隆通贸易有限公司烟花爆竹仓储库房不构成烟花爆竹重大危险源（详见 3.3 重大危险源辨识）。

5.6 评价单元/库房现场检查情况

库房现场检查单元，主要采用检查表法和现场检查法，内容包括《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008 规定的检查表所列项目，主要有定级定量、建筑结构、疏散要求、人员、消防、贮存与运输、制度规程等。根据国家现行法律、行政法规和标准规范要求进行符合性评价，评价结果见附录 A3（评价报告的附录）：烟花爆竹企业安全评价单元（车间）现场检查表；审查和检查为不合格的（2 号爆竹成品库无管理制度和安全标识；3 号烟花成品库和 4 号收缴/回收库大门和库房外墙未设安全标识。），经采取措施整改后评价认定达到安全要求的项目见附录 B（评价报告的附录）：审查和检查为不合格，经采取措施整改后，评价认定达到安全要求项目汇总表。

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.7 重大事故隐患判定

根据国家安全监管总局关于印发《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知，企业重大事故隐患判定结果见表 5.7-1。

表 5.7-1 重大事故隐患判定检查表

序号	检查项目	实际情况	检查结果
1	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。	企业主要负责人和安全生产管理人员已报名培训，暂未培训取证。	风险可控
2	特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检修设备设施。	特种作业人员已报名培训，暂未培训取证。	风险可控

序号	检查项目	实际情况	检查结果
3	职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。	不涉及。	无此项
4	工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。	工（库）房作业人员数量已按核定人数定员。未发现超员情况。	符合要求
5	工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。	工（库）房存储药量未超量存放。	符合要求
6	工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。	工（库）房内部安全距离符合要求，4号1.1级收缴/回收仓库采用自然山体和防护土堤作为防护屏障，符合要求；1.3级仓库可不设防护屏障。	符合要求
7	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。	防静电、防火、防雷设备设施已安装。	符合要求
8	擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建	未擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建。	符合要求
9	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准	景德镇诚隆通贸易有限公司在库区四周部分设置实体密砌围墙，部分高山及较陡处采用刺丝网作为防护措施	符合要求
10	将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。	不涉及。	无此项
11	在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。	不涉及。	无此项
12	中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。	不涉及。	无此项
13	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，已制定实施隐患排查治理制度。	符合要求
14	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	未出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	符合要求
15	生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。	经营的产品种类、危险等级未超许可范围，未使用违禁药物。不涉及生产过程。	符合要求
16	分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。	未分包转包。	不涉及
17	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。	未发现一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营情况。	不涉及

序号	检查项目	实际情况	检查结果
18	许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。	许可证在有效期内，未发现停产停业期间组织生产经营情况。	不涉及
19	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	未发现烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者经营违禁超标产品。不涉及生产过程。	符合要求
20	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。	不涉及。	不涉及

检查结果：该项目验收评价期间未发现企业存在上述重大隐患。

5.8 安全生产条件符合性评价结果

表 5.8-1 安全生产条件符合性评价结果

序号	检查内容	依据	检查结果	结论
1	具有与其经营规模和产品相适应的仓储设施。仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161）等国家标准和行业标准的规定。仓储区域及仓库安装有符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）规定的监控设施，并设立符合《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114）规定的安全警示标志和标识牌。	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 65 号）第六条	景德镇诚隆通贸易有限公司具有与其经营规模和产品相适应的仓储设施。仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161）等国家标准和行业标准的规定。库区安装有监控设施，设立有安全警示标志和标识牌。	合格
2	具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力。	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 65 号）第六条	景德镇诚隆通贸易有限公司具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力。	合格
3	按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 65 号）第六条	已建立烟花爆竹流向信息化管理系统。	合格

序号	检查内容	依据	检查结果	结论
4	有事故应急救援预案、应急救援组织和人员，并配备必要的应急救援器材、设备。	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理局令 第 65 号）第六条	景德镇诚隆通贸易有限公司编制有事故应急救援预案，有应急救援组织和人员，并配备担架、急救药箱（绷带、创伤药品）等必要的应急救援器材、设备。	合格
5	建立安全生产责任制和各项安全管理制度、操作规程。安全管理制度和操作规程至少包括：仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度、装卸（搬运）作业安全规程。	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理局令 第 65 号）第六条	景德镇诚隆通贸易有限公司建立了安全生产责任制和各项安全管理制度、操作规程。	合格
6	有安全管理机构或者专职安全生产管理人员。	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理局令 第 65 号）第六条	景德镇诚隆通贸易有限公司设立了安全管理机构并任命专职安全生产管理人员。	合格
7	主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经培训考核合格，取得相应资格证书。仓库保管员、守护员接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格，取得相应资格证书。其他从业人员经本单位安全知识培训合格。	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理局令 第 65 号）第六条	景德镇诚隆通贸易有限公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员已报名培训，暂未培训取证。其他从业人员经景德镇诚隆通贸易有限公司安全知识培训合格。	风险可控

序号	检查内容	依据	检查结果	结论
8	从事黑火药、引火线批发的企业，除具备《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第65号）第六条规定的条件外，还应当具备必要的黑火药、引火线安全保管措施，自有的专用运输车辆能够满足其配送服务需要，且符合国家相关标准。	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第65号）第七条	非黑火药、引火线批发企业。	不考核
安全生产条件符合性结论意见		经整改后，整改措施有效，符合安全条件。		

5.9 建设项目安全“三同时”检查单元评价

5.9.1 建设项目“三同时”检查

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”等国家法规要求，我单位对景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目安全设施进行检查，确认其安全设施：消防水池、消防水塘、消防泵、避雷设施、人体静电消除装置、视频监控系统均与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

5.9.2 建设项目对《安全设施设计》中安全对策措施的落实情况

该项目委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司出具《安全设施设计》，并经景德镇市应急管理局审查通过，本报告对照《安全设计设施》制定检查表，对该公司2号爆竹成品库、3号烟花成品库、4号收缴/回收仓库“三同时”落实情况进行安全检查，具体见表5.9-1。

表5.9-1 《安全设施设计》中主要对策措施落实情况检查表

序号	《安全设施设计》的对策措施	落实完成情况	结论
一、工艺系统安全措施			
1	库区内各建筑间距满足《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的仓库内部最小允许距离要求；	库区内各建筑间距满足《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的仓库内部最小允许距离要求；详情见表2.7-1	符合要求

2	危险性建筑物（2号爆竹成品库、3号烟花成品库和4号收缴/回收仓库）拟采用钢梁彩钢瓦屋盖，耐火等级达到二级，满足《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的要求；	危险性建筑物采用钢梁彩钢瓦屋盖，耐火等级达到二级，满足《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的要求；	符合要求
3	危险品库房设置防雷设施，有效防止发生雷电火灾爆炸事故；	设置防雷设施，有效防止发生雷电火灾爆炸事故；	符合要求
4	危险品库房设置了防潮层，并设置屋檐，防止仓库潮湿或雨水进入；	设置了防潮层，并设置屋檐，防止仓库潮湿或雨水进入；	符合要求
5	危险品库房四周设置视频监控系统，可对产品储存进出监控，并预防发生火灾爆炸事故；	危险品库房四周设置视频监控系统；	符合要求
6	委托资质的单位进行该项目烟花爆竹成品的运输，装卸前运输车辆先停车熄火。	委托上饶市广丰区祥顺危货运输有限公司进行该项目烟花爆竹成品的运输。	符合要求
二、总平面布置安全措施			
	<p>根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置。2栋1.3级成品库集中布置，危险等级为1.1²级的4号收缴/回收仓库设置在库区的在边缘及有利于安全的地形处。库区周边设置有围墙，设置围墙有困难地段设置为刺丝网围墙。围墙高度不应低于2米，围墙与危险性建筑物之间的距离不小于5m。危险性仓库外5米范围内设置有防火隔离带。库区设有运输主干道，运输主干道中心线与运输主干道周边的仓库的距离均满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。</p> <p>办公室设置在库区入口处，办公室包含门卫值班室及监控室。</p>	<p>根据危险等级和计算药量结合地形布置。2栋1.3级成品库集中布置，危险等级为1.1²级的4号收缴/回收仓库设置在库区的在边缘。在库区四周部分设置实体密砌围墙，其余部分利用高山及较陡处采用刺丝网作为防护措施。围墙高度不应低于2米，围墙与危险性建筑物之间的距离不小于5m。危险性仓库外5米范围内设置有防火隔离带。库区设有运输主干道，运输主干道中心线与运输主干道周边的仓库的距离均满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。</p> <p>办公室设置在库区入口处，办公室包含门卫值班室及监控室。</p>	符合要求
三、电气安全措施			
	<p>该项目库区可沿道路设置照明路灯，照明路灯设置为密封防爆型，外部线路沿道路边采用电缆埋地敷设。危险品仓库内不设置照明灯具，夜间操作采用便携式防爆应急灯。F0类危险场所的4号收缴/回收仓库室外照明设备应选用不低于Db或Gb级、IP65级、最高表面温度不超过135℃的灯具，且应安装在不可开启的窗户外。门灯及安装在外墙外侧的开关、配电箱等的选型应与灯具防爆</p>	<p>库区沿路设置照明路灯，库房内未设照明灯具及其他线路；</p>	符合要求

	要求相同。F1类危险场所的2号爆竹成品库和3号烟花成品库室外的照明灯具可参照F0类危险场所要求设置。		
四、建筑防护设施安全措施			
	产品装卸过程轻装轻卸，装卸区及仓库内地面设置不发火花地面。装卸人员穿防静电服，防静电手套，橡胶靴装卸，设置除静电触摸球，装卸及入库前消除人体静电。	危险品仓库地面为水泥地面，入口处设置静电释放仪；装卸人员配备了防静电服，防静电手套，橡胶靴装卸；	符合要求
	该项目危险品库房的库房门设置为向外开启的双层门，内层通风门（金属纱网门）。通风窗均设置金属纱网，当库房温度过高开门窗通风时可防止小动物入内。各库房四周墙体全部封闭到顶，防止小动物入内。	危险品库房的库房门设置为向外开启的双层门，内层通风门（金属纱网门），外层为防火门；库房四周墙体全部封闭到顶，防止小动物入内。	符合要求
	该项目危险品库房采用钢筋混凝土框架结构，轻质泄压屋盖（如：钢梁彩钢瓦屋盖），耐火等级为二级，符合规范要求。	危险品库房采用钢筋混凝土框架结构，轻质泄压屋盖，耐火等级为二级；	符合要求
五、其他防范设施安全措施			
	烟花运输车辆依托有危险货物运输资质的物流单位运输，驾驶、押运人员等作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训考核，取得相关资格证书，烟花爆竹运输车辆进入库区需安装防火罩。	烟花爆竹运输车辆依托上饶市广丰区祥顺危货运输有限公司运输，驾驶、押运人员等作业人员取得相关资格证书，库区配备防火罩。	符合要求
	<p>防洪：库区傍山而建，应设置满足雨水排放的渠道，危险品库房地势高于沟渠，雨季山水不会对危险品库房有影响。</p> <p>防台风：库区选址于山区，库区东面、南面、西面、北面均为山岭，受台风的影响不大。</p> <p>地质、地震灾害：该项目危险品库房主体结构采用钢筋混凝土框架结构，按6度进行抗震设计。</p>	<p>防洪：库区傍山而建，设置满足雨水排放的渠道，危险品库房地势高于沟渠，雨季山水不会对危险品库房有影响。</p> <p>防台风：库区选址于山区，库区东面、南面、西面、北面均为山岭，受台风的影响不大。</p> <p>地质、地震灾害：该项目危险品库房主体结构采用钢筋混凝土框架结构，按6度进行抗震设计。</p>	符合要求

5.10 综合验收评价结果

评价结论：具备安全验收条件。

6 安全对策措施及整改

6.1 安全对策措施

经现场验收，项目尚存在下列问题，需要采取措施进行整改，使其符合国家法律、法规和标准要求。

6.1-1 存在问题及安全对策措施汇总表

序号	现场检查发现的问题	对策措施
1	未完善库区内警示牌、疏散指示牌	应完善区域指示牌、疏散指示牌
2	仓库未粘贴管理制度	仓库应粘贴管理制度
3	大门附近应设置平面布置图和风险管控图	大门附近应设置平面布置图和风险管控图

6.2 安全对策措施整改复查

存在的不符合项，经企业采取措施整改，评价机构组织评价人员进行了现场核查和确认，判定合格。

6.2-1 企业整改落实情况表

序号	现场检查发现的问题	复查情况	整改结果
1	未完善库区内警示牌、疏散指示牌	已完善区域指示牌、疏散指示牌	已完成整改
2	仓库未粘贴管理制度	仓库已粘贴管理制度	已完成整改
3	大门附近应设置平面布置图和风险管控图	大门附近已设置平面布置图和风险管控图	已完成整改

6.3 建议性安全对策措施

6.3.1 安全技术对策措施

1、运输车辆排气管必须装隔热和火星防护装置，进入危险品仓库区，排气管必须装上熄灭火星装置。

2、运输车辆进入库区作业时，严禁占用安全疏散通道及应急救援通道。必须保持消防安全设施处在应急状态。

3、装卸作业中，只许单件搬运，不得碰撞、拖拉、磨擦、翻滚和剧烈振动，不许使用铁撬等铁质工具。

4、消防泵房地面集中存放有较多手提式干粉灭火器，建议搬至消防器材房。建议按照 GB50140-2005 第 5.1.3 条规定，灭火器铭牌朝外，采取措施

使得灭火器底部离地面高度不宜小于 0.08m。

6.3.2 安全管理对策措施

1、企业应根据国家现行法律、法规和政府监管部门的相关规定，进一步完善安全管理制度，特别针对库区周边情况，对外界因素的影响采取有效管理措施。

2、主要负责人、安全管理人员和烟花爆竹储存作业人员已报名培训，暂未培训取证，建议上述职务人员取得证书之后再进行烟花爆竹经营（批发）业务。

3、企业在经营过程中，应严格执行各项安全管理制度和落实安全生产责任制，尤其是落实仓库检查制度、危险品销售流向登记制度和库区警卫值班制度。

4、严格遵守安全操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业和违章操作；加强经营过程监督检查，及时排查、消除安全隐患。

5、必须严格遵守仓库“三定”（危险等级、定量、定员）规定。严禁改变库房用途，杜绝超量、超员等违章现象。

6、加强对从业人员的安全教育培训，定期开展应急预案演练，及时修订、完善预案。

7、烟花爆竹的储存，应按现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）要求存放；应保持库房内储存条件符合规程要求。

8、该项目安全设施整改过程中，库区总平面布置图已发生变化，建议企业根据整改后总平面布置图，并结合实际安全风险，完善库区“一图一牌”、“三清单”安全告知牌，包括其中的安全风险分布图。

9、《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令 2019 年第 18 号）第三十四条规定，道路运输从业人员诚信考核和计分考核周期为 12 个月。因此，建议企业及时组织危货运输驾驶员、押运员参加诚信考核，对于考核不合格的，请及时调换人员。

10、建议企业按照《生产经营单位安全培训规定》（2015 年修订）开展从业人员上岗前安全教育和年度再教育，并如实记录，建立师傅带徒弟

制度。

11、企业应当按照规定及时修订生产安全事故应急预案，半年至少进行一次预案演练，定期维护应急器材和物资，确保应急状态下能够正常投用。

12、企业应当按照《财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的提取标准和使用范围提取和使用安全生产费用，进行专项核算，编制年度安全生产费用提取和使用的计划和使用记录，确保安全生产投入的有效实施。

13、企业应按照制订的《安全生产例会制度》严格执行会议记录，并进行相关人员签名。

14、企业应按照制订的《安全检查和隐患排查治理制度》严格执行安全检查和隐患排查治理事宜，如实记录安全检查情况和隐患排查治理情况，并进行相关人员签名。

15、企业今后经营过程中，应当及时为全体从业人员及时缴纳工伤保险，投保安全生产责任保险（名单覆盖危险岗位从业人员）。

16、企业应按规定建立安全风险分级管控机制，编制“一图一牌三清单”；建立隐患排查治理机制，及时检查、消除隐患，留存相关记录。

17、企业未设置燃放试验场，如需设置燃放试验场，燃放试验场边缘距离观众大于等于50米、距离建筑物大于等于35米、距离重要场所大于等于100米。

18、企业未设置销毁场，如需设置销毁场，销毁场边缘距离场外任何建筑物距离均大于65米，并已在处置场所设立明显的安全警示标志，废弃药物采用焚烧销毁法销毁，一次烧毁药量为20kg，销毁时采取远距离点火方式，处置人员戴头盔进行销毁，焚烧完毕后对现场进行清理，确认彻底销毁，确认彻底销毁并确认火种已熄灭。

6.3.3 其他安全对策措施

1、企业应提高自身的安全意识，加强所涉及范围内的安全管理，防患于未然，不能随意变更经营方式，杜绝安全事故的发生。

2、在经营许可证规定的经营范围内从事烟花爆竹批发经营活动。

3、运输配送烟花爆竹应当遵守当地县级以上道路交通、公安、安全生产监管等部门的规定，严禁超范围、超载质量运输烟花爆竹。

4、经常开展安全教育活动，提高职工的安全意识和技能；对新上岗职工必须进行专业培训，经考核合格后，才能上岗。

5、保障职工身体健康，定期对职工进行体检，并建立医疗档案。定期为职工购买工伤保险。

6、其他建议

根据《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第65号）第八条的规定：批发企业申请领取《烟花爆竹经营(批发)许可证》时，应当向发证机关提交下列申请文件、资料，并对其真实性负责：

- 1) 经营（批发）许可证申请书（一式三份）；
- 2) 企业法人营业执照副本或者企业名称工商预核准文件复制件；
- 3) 安全生产责任制文件、事故应急救援预案备案登记文件、安全管理制度和操作规程的目录清单；
- 4) 主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理机构和仓库保管员、守护员的相关资格证书复制件；
- 5) 具备相应资质的设计单位出具的库区外部安全距离实测图和库区仓储设施平面布置图；
- 6) 具备相应资质的安全评价机构出具的安全评价报告，安全评价报告至少包括《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第65号）第六条第三项、第四项、第八项、第九项和第七条规定条件的符合性评价内容；
- 7) 烟爆存储建设项目安全设施设计审查和竣工验收的证明材料；
- 8) 运输车辆以及驾驶员、押运员的相关资质（资格）证书复制件；
- 9) 法律、法规规定的其他文件、资料。

7 安全验收评价结论

我公司根据国家有关法律、法规、标准，按《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）规定的程序、方法，对景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目进行安全验收评价。

7.1 安全设施整改项目安全设施“三同时”落实情况

景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目按设计文件施工建设，在建设过程中，严格执行国家有关安全设施“三同时”的管理规定，其消防、防雷、防静电等安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施整改符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）及《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）的要求。

同时公司建立了各项安全管理制度，明确了各级各类人员的安全职责，并制定了事故应急预案。公司主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员已报名培训，暂未取证。

7.2 安全设施整改项目安全验收评价结论

我公司评价人员对景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目进行现场检查，《烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表》、《烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表》和《烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表》中所有考核项目全部合格。

景德镇诚隆通贸易有限公司昌江区荷塘乡烟爆存储建设项目储存设施及安全管理具备安全验收条件，符合储存及经营组合烟花类 (C、D) 级、玩具类(C、D) 级、吐珠类(C) 级、升空类(C) 级、旋转类(C、D) 级、喷花类 (C、D) 级、爆竹类 (C) 级的安全条件。

希望景德镇诚隆通贸易有限公司按照本报告第 6 章提出的安全对策、措施和建议，进一步提高安全经营条件，并在今后的经营过程中，严格遵守国家的有关法律、法规及标准，切实执行各项规章制度，加强日常管理，以保障安全生产，确保安全经营。

附录（评价报告的附录）

本报告所载附录，为评价报告的附录，是评价报告的重要组成部分，与本评价报告具有同等的作用和效力。

附录 A（评价报告的附录）：烟花爆竹企业安全评价资料审核和现场检查表

附录 A1（评价报告的附录）：

烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	组织结构	法人条件证明	有营业执照。	合格
		安全生产组织机构	设有安全生产组织机构。	合格
		产品质量检测检验管理机构	设有产品质量检测检验管理机构。	合格
		保卫组织机构	设有仓库保卫组织机构。	合格
		应急救援组织	设有应急救援组织。	合格
2	从业人员	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证明	企业主要负责人、安全管理员已报名培训，暂未培训取证。	风险可控
		守护员、保管员培训考核上岗资格证明	守护员、保管员已报名培训，暂未培训取证。	风险可控
		驾驶、押运人员资格证明	驾驶、押运人员有合格的资质证书。	合格
		其他从业人员培训上岗资格证明	其他从业人员经培训并取得岗位资格证书。	合格
		工伤保险名单	已参加工伤保险。	合格
3	规章制度	安全生产责任制度	有安全生产责任制度。	合格
		安全管理责任制度	有安全管理责任制度。	合格
		安全检查和隐患排查治理制度	有安全检查和隐患排查治理制度。	合格
		安全设施设备管理制度	有安全设施设备管理制度。	合格
		从业人员安全教育培训制度	有从业人员安全教育培训制度。	合格
		安全目标管理与奖惩制度	有安全目标管理与奖惩制度。	合格
		动火作业管理制度	有动火作业管理制度。	合格
		安全生产费用提取和使用管理制度	有安全生产费用提取和使用管理制度。	合格

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
		安全操作规程	有安全操作规程。	合格
		重大危险源评估与监控措施	未构成烟花爆竹重大危险源	合格
		产品流向登记管理制度	有产品流向登记管理制度。	合格
		产品检验和验收制度	有产品检验和验收制度。	合格
		隐患排查整改和事故记录	有隐患排查整改记录，未发生事故。	合格
		事故应急救援预案	有事故应急救援预案。	合格
		事故应急救援与事故报告制度	有事故应急救援与事故报告制度。	合格
		仓库安全管理制度	有仓库安全管理制度。	合格
		仓库保管守卫制度	有仓库保管守卫制度。	合格
		防火防爆安全管理制度	有防火防爆安全管理制度。	合格
		买卖合同管理制度	有买卖合同管理制度。	合格
		违规违章行为处理制度	有违规违章行为处理制度。	合格
		企业负责人值（带）班制度	有企业负责人值（带）班制度。	合格
		安全生产费用提取和使用制度	有安全生产费用提取和使用制度。	合格
		其他相关资料	有其他相关资料。	合格
4	技术资料	设计说明书	有设计说明书。	合格
		平面布局图	有平面布局图。	合格
		库房施工设计图	有库房施工设计图。	合格
		安全设施和设备清单	有安全设施和设备清单。	合格
		消防设施和设备清单	有消防设施和设备清单。	合格
		主要生产设施和设备检测合格证明	作业场所无专用生产设施和设备，不考核。	——
		特种设备检验合格证明	作业场所无特种设备，不考核。	——
		配送运输车辆情况	委托具有危险货物运输资质公司进贤配送、运输。	合格
资料审查结论意见			符合安全条件	

附录 A2（评价报告的附录）：

烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
1	总体布局	选址	符合要求	合格
		围墙	景德镇诚隆通贸易有限公司在库区四周部分设置实体密砌围墙，部分高山及较陡处采用刺丝网作为防护措施	合格
		功能分区	库区分为储存区、办公区。	合格
		建筑物危险等级划分和布置	危险性建筑物危险等级为 1.3 及 1.1 ⁻² 级。	合格
		危险品运输通道	库区设有不小于 3.5 米危险品运输通道。	合格
		值班室	库区设有工作人员值班室。	合格
		外部安全距离	库区外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家相关标准规定。	合格
		安全疏散条件	库区主要道路与安全出口相连，满足安全疏散要求。	合格
2	条件和设施	库区主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度	库区主要道路宽大于 3.5 米，纵坡坡度小于 6%。	合格
		消防设施、消防水源水量、保护范围、补充空间	库区设消防水池、消火栓、水枪、水带、消防水泵等，消防给水水源主要来源于库区自备水井，消防保护范围小于 150 米，消防给水补充时间小于 48 小时，符合要求。	合格
		安全监控保卫设施和固定值班电话	已设置安全监控保卫设施和固定值班电话。	合格
总体布局和条件设施现场检查结论意见			符合安全条件	

附录 A3（评价报告的附录）：**评价单元/车间现场检查意见及结论意见表**

评价单元/车间（库房）名称	现场检查表编号	评价单元/车间（库房） 现场检查意见
2号爆竹成品库	01	符合安全条件
3号烟花成品库	02	符合安全条件
4号收缴/回收仓库	03	符合安全条件
评价单元/车间现场检查结论意见	符合安全条件	

烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表

评价单元/库房名称：2号爆竹成品库

评价单元/库房检查表编号：01

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
1	定级 定量	建筑物危险等级	储存仓库危险等级定为 1.3 级和 1.1 ⁻² 级。	合格
		核定存药量	核定存药量为 10000kg。	合格
		内部安全距离	与周边建筑物之间内部距离表详见本报告第 2.7.1 章节《内部距离》。	合格
		安全标识标志	现场验收时发现安全标识标志、管理制度未设置。	不合格
2	建筑 结构	建筑设计和结构	库房按照设计采用刚劲混凝土框架结构。	合格
		建筑物防火等级	库房耐火等级达到二级。	合格
		门的开启方向、宽度、数量以及与其他建筑物门的对应方向等	库房门向外开启，门的宽度 1.8 米，库房设 4 个门。	合格
		窗的结构、材料及开启方向	仓库设置有高窗，配置金属网。	合格
		屋盖的材料、结构	库房采用彩钢瓦屋面。	合格
		墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等	在板底标高处沿外墙、内纵墙设置钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重，外四角及单元内外墙交接处设置构造柱；符合要求。	合格
		地面阻燃性、柔性、导静电性能	仓库内不开箱，地面采用一般水泥地面	合格
		仓库防潮、隔热、通风与防小动物	仓库防潮、隔热、通风与防小动物符合要求。	合格
3	疏散 要求	安全出口的数量、设置方向和位置，疏散距离	库房设 4 个安全出口，向外开启，仓库内任一点至安全出口的距离均小于 15 米。	合格
		建筑物内的通道宽度	库房内搬运通道的宽度为 1.5 米，检查、清点通道宽度为 0.7 米。	合格
		门口的台阶及坡度	库房门口不设台阶。	合格
4	人员	核定数量	库房定员 8 人。	合格
		培训和上岗证	主要负责人、专职安全员、特种作业人员已报名培训，暂未培训取证，危货运输驾驶员和押运员均经过相应培训并取得安全资格证书。	风险可控

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
		衣着、防护用品及材质	企业为从业人员配备必要的工作鞋、手套、防静电工作服等劳动保护用品。	合格
		年龄和身体状况	从业人员年龄和身体条件符合法定条件。	合格
5	防护屏障	防护屏障设立	该库房可不设防护屏障，不考核。	——
		防护屏障的形式和防护能力	该库房可不设防护屏障，不考核。	——
6	消防	设施、器材的配置和检验	库房配备干粉灭火器并经年度检测合格。	合格
		防火设备和措施	耐火等级符合要求，且库房之间保持安全距离。	合格
		电气设备的选型与安装	库房内无电气设备等电气设施，不考核。	——
		电气照明的选型与安装	库房内无电气照明等电气设施，不考核。	——
		电线的选型、连接、敷设	库房内无电气设施，不考核。	——
		建筑物的防雷	采取防直击雷措施。	合格
		设备和电气的接地	无设备和电气，不考核。	——
		设备的检修和维护	无设备，不考核。	——
		消除人体静电装置	库房门口设有消除人体静电装置。	合格
7	贮存与运输	产品堆垛的高度和堆垛间距	已按要求设置堆垛线及堆垛间距	合格
		运输通道的宽度	库房内主要运输通道宽度为 1.5 米。	合格
		库房地面防潮措施	经进行防潮处理后的水泥地面上铺木架存放箱装产品，防潮符合要求。	合格
		库房内温度、湿度、通风的控制	采用自然风压通风。库房设有温度湿度计。	合格
		机动车库区行驶路线和装卸	机动车辆沿库区运输道路行驶，并画有装卸停车线。	合格
8	制度规程	岗位安全管理制度	现场有岗位安全管理制度。	合格
		岗位安全操作规程	现场有岗位安全操作规程。	合格
现场检查结论意见			有一项不合格，不符合条件，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。	

评价单元/库房名称：3号烟花成品库

评价单元/库房检查表编号：02

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
1	定级 定量	建筑物危险等级	储存仓库危险等级定为 1.3 级。	合格
		核定存药量	仓库核定存药量为 10000kg。	合格
		内部安全距离	与周边建筑物之间内部距离表详见本报告第 2.7.1 章节《内部距离》。	合格
		安全标识标志	库区大门和库房外墙未设安全标识。	不合格
2	建筑 结构	建筑设计和结构	库房按照整改设计采用钢筋混凝土框架结构。	合格
		建筑物防火等级	库房耐火等级达到二级。	合格
		门的开启方向、宽度、数量以及与其他建筑物门的对应方向等	库房门向外开启，门的宽度 1.8 米，库房设 4 个门。	合格
		窗的结构、材料及开启方向	仓库设置有高窗，配置金属网。	合格
		屋盖的材料、结构	库房采用彩钢瓦屋面。	合格
		墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等	在板底标高处沿外墙、内纵墙设置钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重，外四角及单元内外墙交接处设置构造柱；符合要求。	合格
		地面阻燃性、柔性、导静电性能	仓库内不开箱，地面采用一般水泥地面	合格
仓库防潮、隔热、通风与防小动物	仓库防潮、隔热、通风与防小动物符合要求。	合格		
3	疏散 要求	安全出口的数量、设置方向和位置，疏散距离	库房设 4 个安全出口，向外开启，仓库内任一点至安全出口的距离均小于 15 米。	合格
		建筑物内的通道宽度	库房内搬运通道的宽度为 1.5 米，检查、清点通道宽度为 0.7 米。	合格
		门口的台阶及坡度	库房门口不设台阶。	合格
4	人员	核定数量	库房定员 8 人。	合格
		培训和上岗证	主要负责人、专职安全员、特种作业人员已报名培训，暂未培训取证，危货运输驾驶员和押运员均经过相应培训并取得安全资格证书。	风险可控

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
		衣着、防护用品及材质	企业为从业人员配备必要的工作鞋、手套、防静电工作服等劳动防护用品。	合格
		年龄和身体状况	从业人员年龄和身体条件符合法定条件。	合格
5	防护屏障	防护屏障设立	该库房可不设防护屏障，不考核。	——
		防护屏障的形式和防护能力	该库房可不设防护屏障，不考核。	——
6	消防	设施、器材的配置和检验	库房配 12 具 5kg 规格干粉灭火器并经年度检测合格。	合格
		防火设备和措施	耐火等级符合要求，且库房之间保持安全距离。	合格
		电气设备的选型与安装	库房内无电气设备等电气设施，不考核。	——
		电气照明的选型与安装	库房内无电气照明等电气设施，不考核。	——
		电线的选型、连接、敷设	库房内无电气设施，不考核。	——
		建筑物的防雷	采取防直击雷措施。	合格
		设备和电气的接地	无设备和电气，不考核。	——
		设备的检修和维护	无设备，不考核。	——
		消除人体静电装置	库房门口设有消除人体静电装置。	合格
7	贮存与运输	产品堆垛的高度和堆垛间距	已按要求设置堆垛线及堆垛间距	合格
		运输通道的宽度	库房内主要运输通道宽度为 1.5 米。	合格
		库房地面防潮措施	经进行防潮处理后的水泥地面上铺木架存放箱装产品，防潮符合要求。	合格
		库房内温度、湿度、通风的控制	采用自然风压通风。库房设有温度湿度计。	合格
		机动车库区行驶路线和装卸	机动车辆沿库区运输道路行驶，并画有装卸停车线。	合格
8	制度规程	岗位安全管理制度	现场有岗位安全管理制度。	合格
		岗位安全操作规程	现场有岗位安全操作规程。	合格
现场检查结论意见			有一项不合格，不符合条件，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。	

评价单元/库房名称：04号收缴/回收库

评价单元/库房检查表编号：03

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
1	定级 定量	建筑物危险等级	储存仓库危险等级定为 1.1 ² 级。	合格
		核定存药量	仓库核定存药量为 500kg。	合格
		内部安全距离	与周边建筑物之间内部距离表详见本报告第 2.7.1 章节《内部距离》。	合格
		安全标识标志	库区大门和库房外墙未设有安全标识。	不合格
2	建筑 结构	建筑设计和结构	库房按照整改设计采用钢筋混凝土框架结构。	合格
		建筑物防火等级	库房耐火等级达到二级。	合格
		门的开启方向、宽度、数量以及与其他建筑物门的对应方向等	库房门向外开启，门的宽度 1.8 米，库房设 1 个门。	合格
		窗的结构、材料及开启方向	仓库设置有高窗，配置金属网。	合格
		屋盖的材料、结构	库房采用彩钢瓦屋面。	合格
		墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等	在板底标高处沿外墙、内纵墙设置钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重，外四角及单元内外墙交接处设置构造柱；符合要求。	合格
		地面阻燃性、柔性、导静电性能	仓库内不开箱，地面采用一般水泥地面	合格
3	疏散 要求	安全出口的数量、设置方向和位置，疏散距离	库房设 1 个安全出口，向外开启，仓库内任一点至安全出口的距离均小于 15 米。	合格
		建筑物内的通道宽度	库房内搬运通道的宽度为 1.5 米，检查、清点通道宽度为 0.7 米。	合格
		门口的台阶及坡度	库房门口不设台阶。	合格
4	人员	核定数量	库房定员 2 人。	合格
		培训和上岗证	主要负责人、专职安全员、特种作业人员已报名参加培训，暂未培训取证，危货运输驾驶员和押运员均经过相应培训并取得安全资格证书。	风险可控

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
		衣着、防护用品及材质	企业为从业人员配备必要的工作鞋、手套、防静电工作服等劳动防护用品。	合格
		年龄和身体状况	从业人员年龄和身体条件符合法定条件。	合格
5	防护屏障	防护屏障设立	该库房已设四面防护屏障。	合格
		防护屏障的形式和防护能力	该库房四面采用自然山体和防护土地作为防护屏障，防护能力有效。	合格
6	消防	设施、器材的配置和检验	库房配 8 具 5kg 规格干粉灭火器并经年度检测合格。	合格
		防火设备和措施	耐火等级符合要求，且库房之间保持安全距离。	合格
		电气设备的选型与安装	库房内无电气设备等电气设施，不考核。	——
		电气照明的选型与安装	库房内无电气照明等电气设施，不考核。	——
		电线的选型、连接、敷设	库房内无电气设施，不考核。	——
		建筑物的防雷	采取防直击雷措施。	合格
		设备和电气的接地	无设备和电气，不考核。	——
		设备的检修和维护	无设备，不考核。	——
		消除人体静电装置	库房门口设有消除人体静电装置。	合格
7	贮存与运输	产品堆垛的高度和堆垛间距	已按要求设置堆垛线及堆垛间距	合格
		运输通道的宽度	库房内主要运输通道宽度为 1.5 米。	合格
		库房地面防潮措施	经进行防潮处理后的水泥地面上铺木架存放箱装产品，防潮符合要求。	合格
		库房内温度、湿度、通风的控制	采用自然风压通风。库房设有温度湿度计。	合格
		机动车库区行驶路线和装卸	机动车辆沿库区运输道路行驶，并画有装卸停车线。	合格
8	制度规程	岗位安全管理制度	现场有岗位安全管理制度。	合格
		岗位安全操作规程	现场有岗位安全操作规程。	合格
现场检查结论意见			有一项不合格，不符合条件，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。	

附录 B（评价报告的附录）：

与标准不相符合，经评价机构认定作出合格判定的项目汇总表

附录 B1 烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核

与标准不相符合，经评价机构认定作出合格判定的项目汇总表

序号	项目名称	与标准不相符合情况	评价认定情况	备注
	无			

附录 B2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查

与标准不相符合，经评价机构认定作出合格判定的项目汇总表

序号	项目名称	与标准不相符合情况	评价认定情况	备注
	无			

附录 B3 烟花爆竹企业安全评价单元（车间）现场检查表

与标准不相符合，经评价机构认定作出合格判定的项目汇总表

序号	项目名称	与标准不相符合情况	评价认定情况	备注
1	定级定量	现场验收时发现安全标识标志、管理制度未设置。	复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。	

附件：景德镇诚隆通贸易有限公司提供的资料清单

- 1、评价人员现场照片；
- 2、竣工验收意见汇总表及整改照片；
- 3、评价委托书；
- 4、营业执照；
- 5、主要负责人、安全管理人员、特种作业人员证书；
- 6、防雷检测报告；
- 7、防静电检测报告；
- 8、视频监控安装验收单；
- 9、工伤保险及安全责任险；
- 10、应急预案备案登记表；
- 11、《烟花爆竹批发企业储存建设项目安全设施设计审查意见书》
(景烟花爆竹项目安设审字[2024]1号)；
- 12、运输协议及资质；
- 13、项目备案证及批复；
